

Организация и планирование работ

Обобщенные элементы технико-экономического обоснования

Резюме проекта

Описание продукта

Анализ рынка и потребностей пользователей

Описание технологических решений

Организация и планирование работ

Оценка затрат на реализацию проекта

Оценка эффекта от реализации проекта

Оценка экономической эффективности проекта

Организация и планирование работ

Описание структуры команды проекта, ответственности порядка его реализации, а также оценка сроков выполнения работ

Организация и планирование работ

Определение участников проекта и их ролей

Определение этапов и сроков выполнения работ

Составление календарного плана работ

Построение диаграммы Ганта

Определение участников проекта и их ролей

Определение
участников проекта

Определение ролей
участников проекта

Определение зон
ответственности
участников проекта

Участники проекта

Люди и организации, принимающие участие в реализации проекта и выполняющие определённые функции в рамках достижения его целей

Участники проекта

Участники проекта

Лица, непосредственно принимающие участие в реализации проекта



Стейкхолдеры

Лица, заинтересованные в результатах проекта или влияющие на них

Участники проекта

Инициатор
проекта

Руководитель
проекта

Команда
проекта

Заказчик
(пользователь)

Внешние
исполнители

Логика распределения ролей и ответственности



Функция

Совокупность связанных задач или обязанностей, выполняемых в рамках одной области деятельности, направленных на достижение определенных целей

Возможные функции в рамках проекта

Управление проектом

Анализ требований заказчика

Проектирование решения


Разработка продукта

Дизайн пользовательского интерфейса

Тестирование и контроль качества

Внедрение и сопровождение

Определение ролей проекта

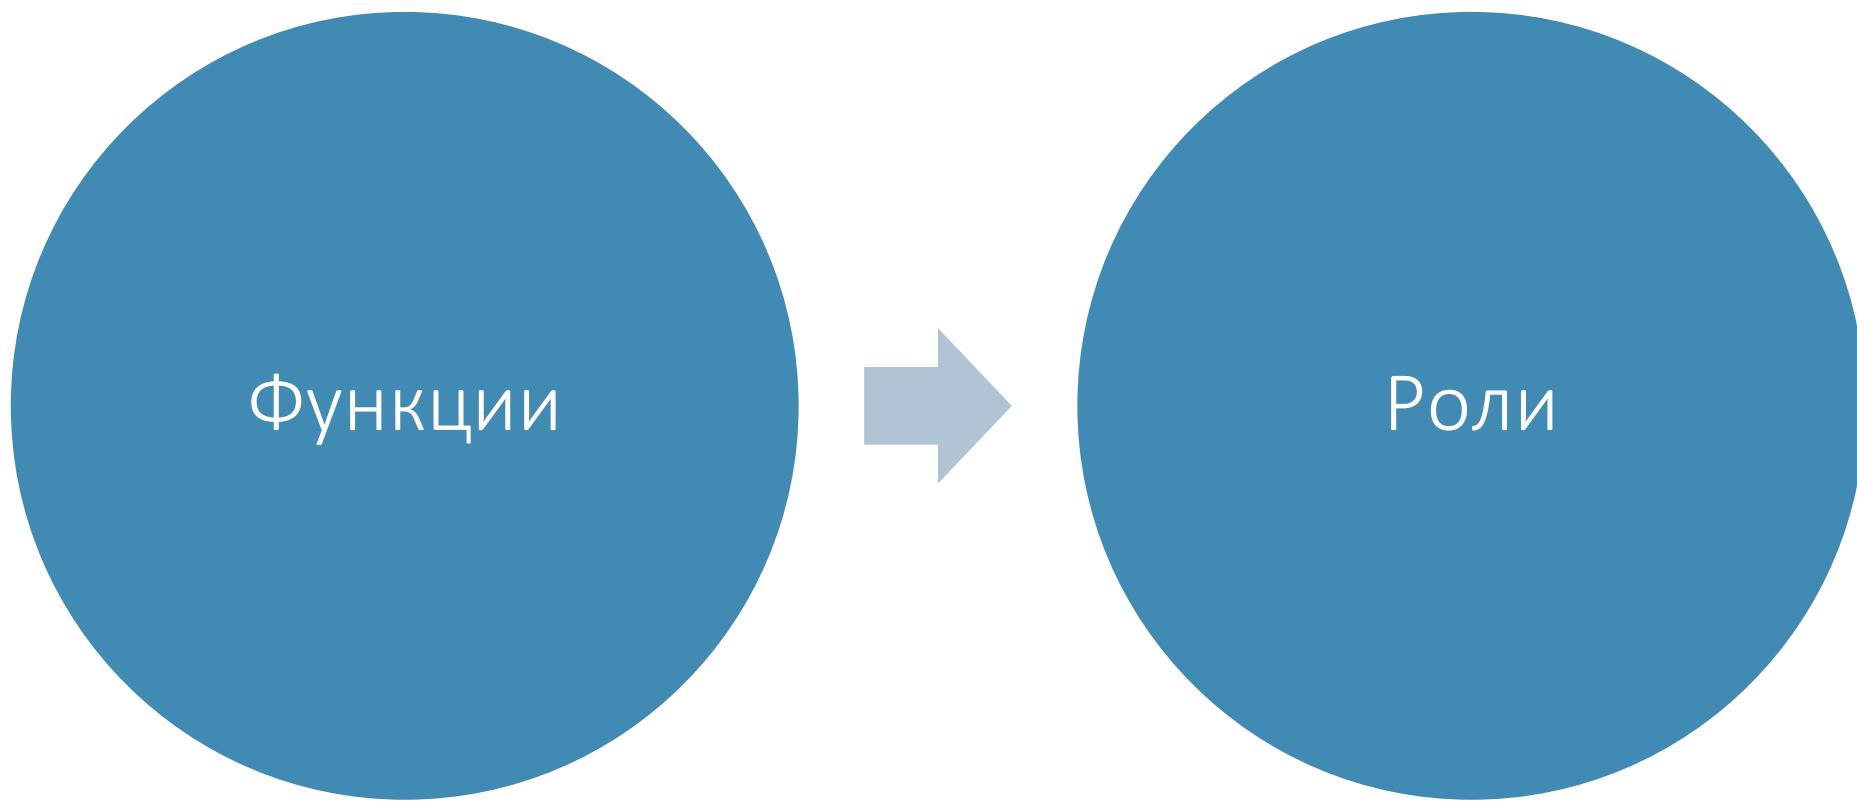

Роль

Набор функций, закреплённый за участником проекта и определяющий его вклад в достижение целей проекта независимо от конкретной личности исполнителя

Возможные роли в рамках проекта

Руководитель
проекта

Аналитик

Разработчик

Дизайнер

Тестировщик

Определение зон ответственности

За какой результат
отвечает роль?

Какие решения она
вправе принимать?

За что она не несёт
ответственности?

Матрица ответственности RACI

Инструмент для распределения ролей
и ответственности за задачи проекта
между его участниками

Матрица ответственности RACI

Responsible

Выполняет работу

Accountable

Несёт ответственность за результат

Consulted

Участвует в согласовании

Informed

Информируется о ходе выполнения

Матрица ответственности RACI

Задача	Руководитель проекта	Аналитик	Разработчик	Дизайнер	Тестировщик
Анализ требований	A	R	C	C	I
Проектирование решения	A	R	C	C	I
Разработка функционала	A	C	R	I	C
Разработка интерфейса	A	C	C	R	I
Тестирование продукта	A	I	C	I	R
Подготовка к внедрению	A	C	R	I	C

Организация взаимодействия между участниками проекта

Выбор каналов коммуникации

Разработка регламента проведения совещаний

Определение ответственных за коммуникацию

Роли и зоны ответственности в учебных и небольших проектах

Сокращённый
набор ролей

Возможность
совмещения ролей

Отсутствие
детального описания

Определение этапов и сроков выполнения работ

Определение ключевые этапов проекта

Определение сроков выполнения каждого этапа

Определение зависимостей между этапами

Этап проекта

Логически завершённая последовательность взаимосвязанных работ, по итогам которой достигается один из основных промежуточных результатов проекта

Возможные этапы проекта

Анализ требований заказчика

Проектирование

Разработка продукта

Тестирование

Внедрение

Сопровождение

Методы планирования



Календарное
планирование

Сетевое
планирование

Гибкие методы
планирования

Календарное планирование

Метод планирования, при котором этапы работ распределяются по временной шкале с указанием конкретных сроков их начала и завершения

Календарное планирование

Этап	Сроки выполнения	Ответственный
Анализ требований заказчика	10.01.2025 - 23.01.2025	Аналитик
Проектирование	20.01.2025 - 14.02.2025	Аналитик
Разработка	17.02.2025 - 17.04.2025	Разработчик Дизайнер
Тестирование	05.03.2025 - 25.04.2025	Тестировщик
Внедрение	28.04.2025 - 15.05.2025	Разработчик

Диаграмма Ганта

Инструмент визуализации плана проекта, отображающий задачи в виде горизонтальных полос на временной шкале, каждая из которых показывает начало и завершение задачи, продолжительность её выполнения а также её зависимость от других задач


Диаграмма Ганта

[illegible]

Сетевое планирование

Метод планирования, который позволяет определить последовательность задач, их взаимосвязи и критический путь проекта с помощью сетевого графика

Сетевое планирование (PERT-диаграмма)

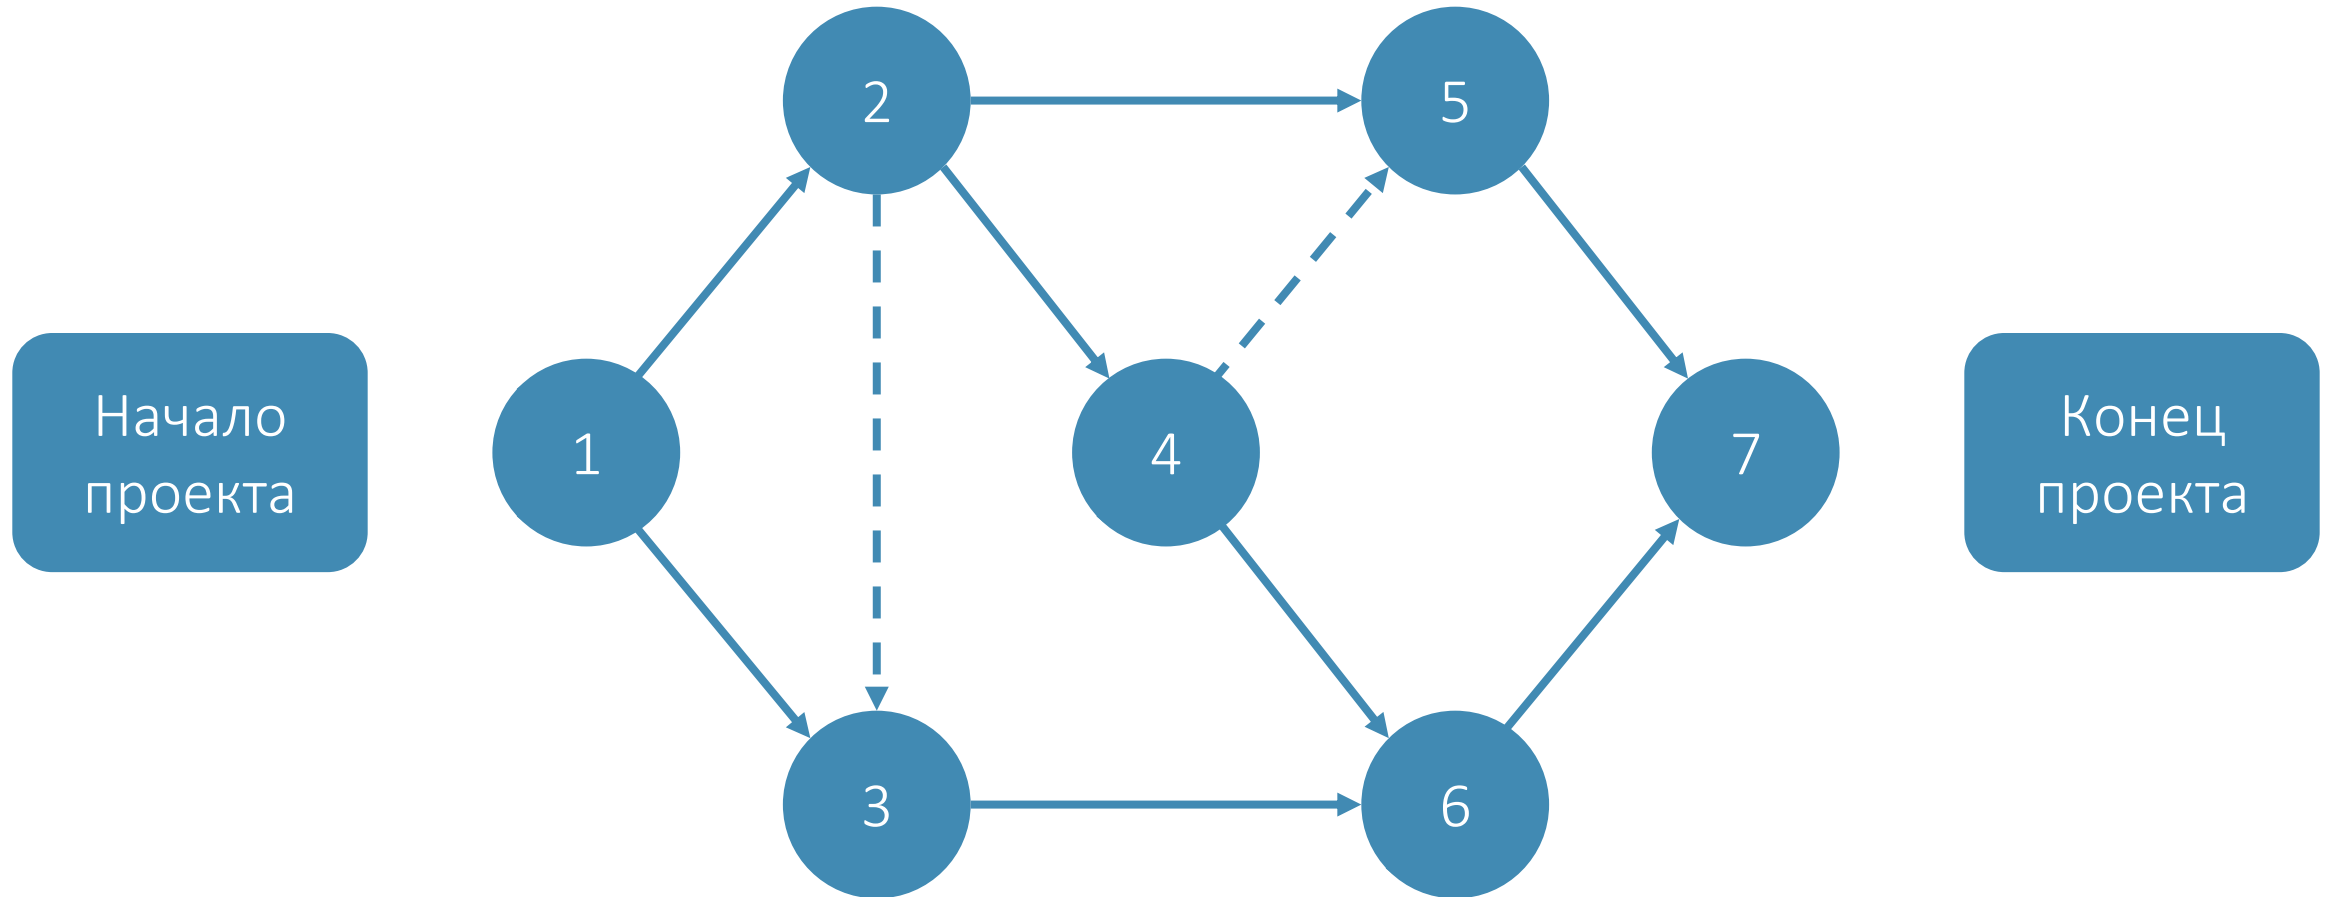

Гибкие методы планирования

Проект реализуется как последовательность коротких итераций

Итерации включают все работы необходимые для получения результата

Результатом каждой итерация является готовый элемент продукта

Требованию к продукту уточняются по мере выполнения проекта
